

RESERVA DE MODELIA
Parque Residencial



¡Nuestro progreso!

Boletín #13 Julio 2020

Trabajamos para entregarles un proyecto de calidad, queremos informarles los avances logrados en este mes.


1. Terminacion excavacion zona 4
2. Terminacion excavacion a cimentacion Zona 10
3. Vaciado de tanque de suministro
4. Vaciado de tanque de incendio
5. Torre 1 Estructura
 - a. Vaciado Cubierta
 - b. Vaciado cubierta tecnica
6. Torre 2 Estructura
 - a. Vaciado piso 12
 - b. Vaciado cubierta
8. Torre 1 Muros
 - a. Fin muros obra negra piso 4-5
 - b. inicio muros obra gris piso 6
9. Torre 2 Muros
 - a. Muros obra negra piso 4
 - b. Inicio muros obra gris piso 5
10. Redes secas y humedas
 - a. Redes piso 6 7



Aspecto general

Torre 1

Torre 2

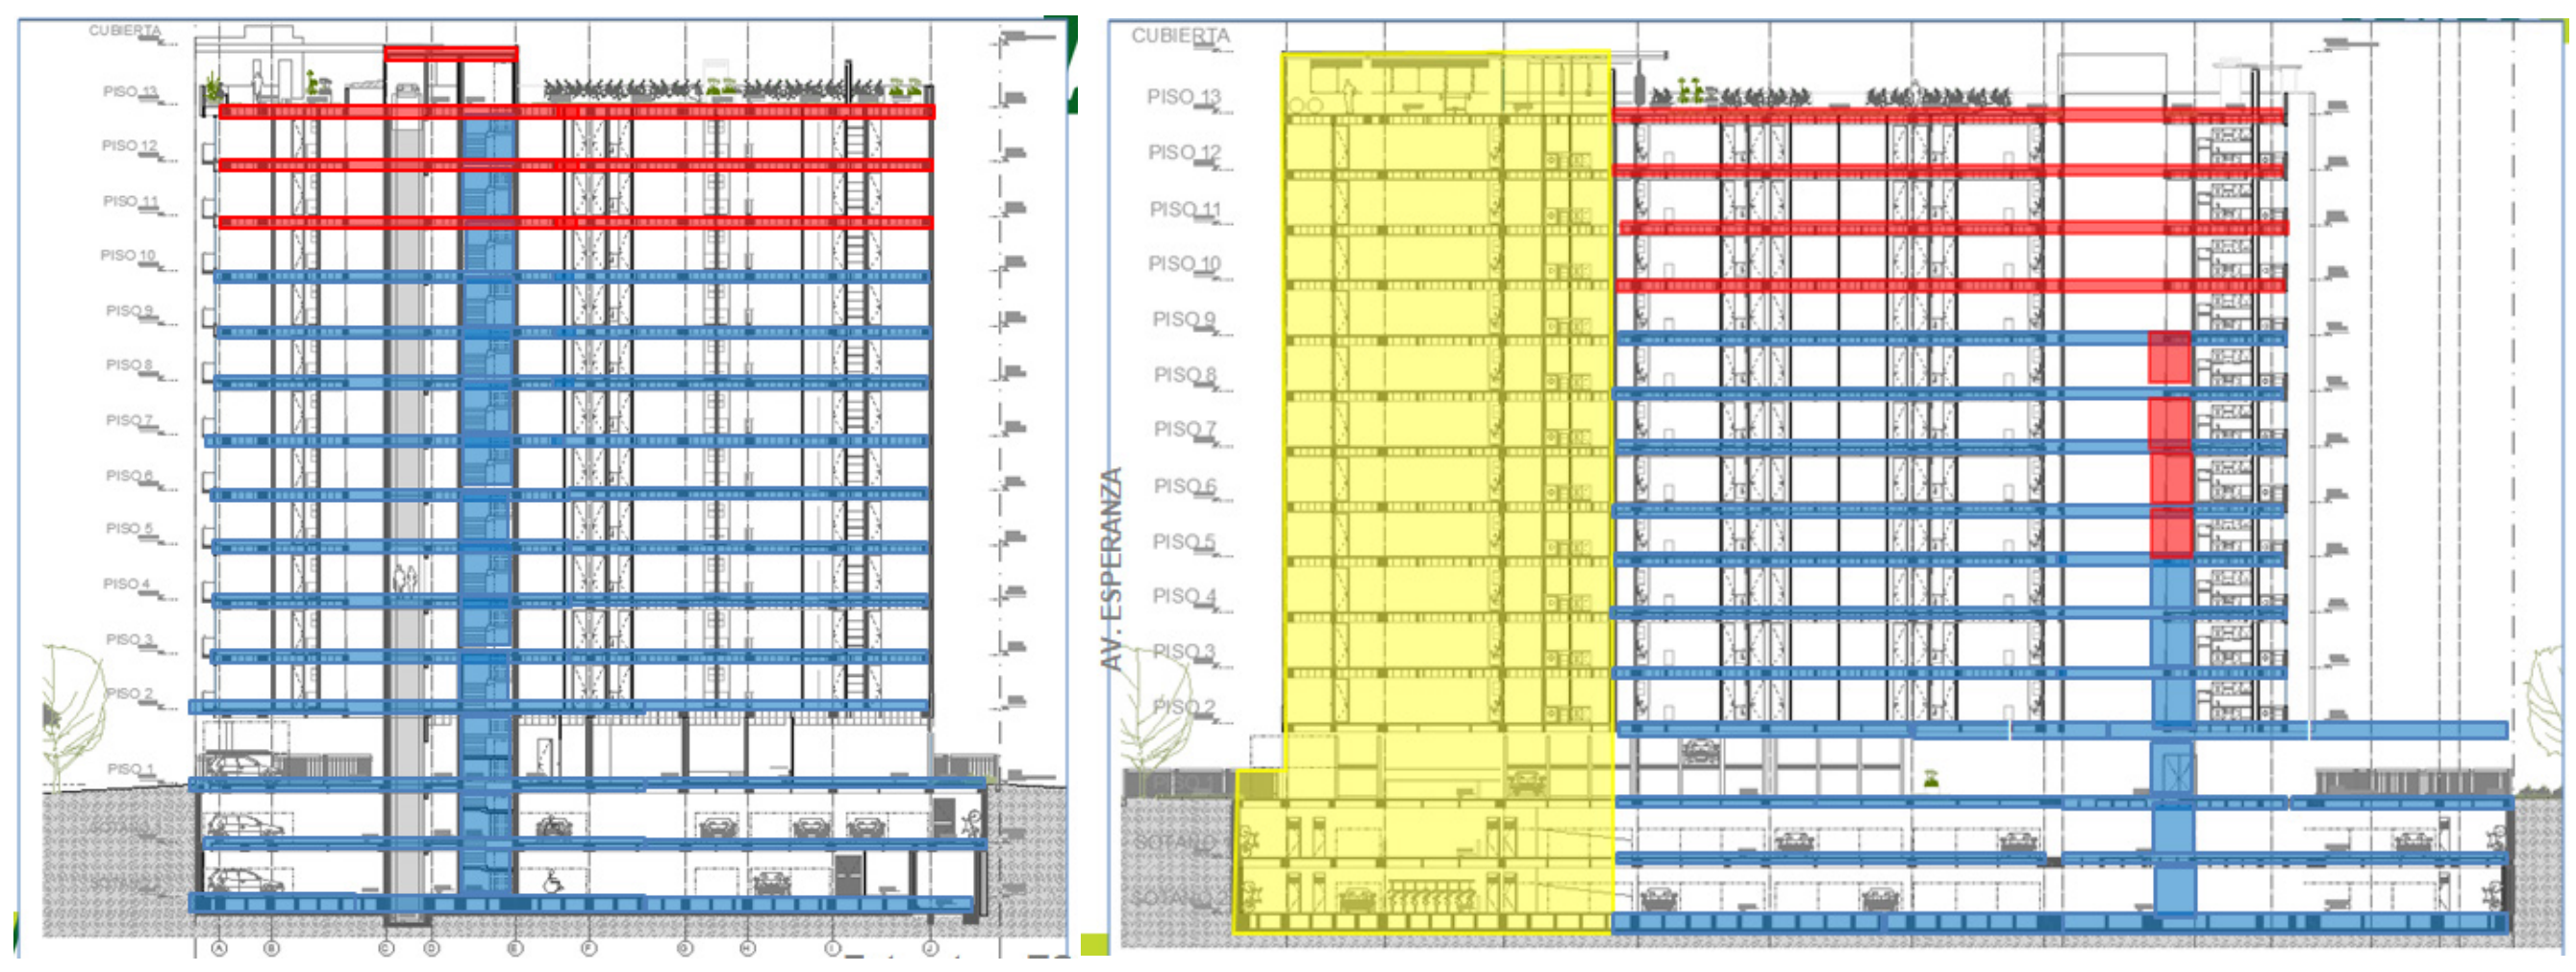

Placas de concreto

Actividades



Demolición contrafuertes



FARMATODO

Cubierta Torre 1 y cubierta tecnica



Cubierta Torre 2





Trabajos de fachada



Fachada sur torre 1



Fachada norte torre 1

Trabajos de obra negra y obra gris





FARMATODO

Trabajos piso 7 torre 2



Áreas de construcción

